

行政文件自動化系統

分組專題提案報告

需求單位	研發處 計畫管理組
組別	第九組
組員	林承駿、蔣侑宸、李恩齊
日期	2026/10/21

需求單位與需求總覽

需求單位

研發處 計畫管理組

聯絡窗口

鍾佳玲、黃詩媛、Karen

痛點

跨處室文件量大，人工處理費時且易出錯

三項需求

需求一	跨處室會議紀錄統整
需求二	定期統計報表產出
需求三	Excel SOP 自動化

需求一：跨處室會議紀錄統整

痛點



- 會議紀錄來自不同處室，格式不一
- 需逐份手動調整，再合併成一份

需求



- 自動統整為統一格式
- 合併成一份完整文件
- 忠實保留原文，不加入額外見解

現行人工流程

收文 → 逐份調整格式 → 複製貼上合併 → 校對

需求二：定期統計報表產出

同一資料來源



研發系統匯出的
原始 Excel

六種定期統計報表

- 台積院統計
- 校庫統計
- 研發會議 / 行政會議計畫統計
- SDGs 指標統計
- … 等

> 「媽媽都一樣，只是產出不同的小孩」
>
> —— 承辦人員

痛點

每份報表都要人工篩選欄位、判斷領域、加總統計

需求三：Excel SOP 自動化

■ 輸入資料 | 實際 Excel 表頭（部分欄位）

報告提出日期			報告建議採納情形			
年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數

↓

前置 篩選該年度資料

↓

條件	處理方式
◆ 無日期	標示「逾期未上傳」 跨欄置中
◆ 有日期，號碼不正確	依號碼標示須交給的處室 跨欄置中
◆ 有日期，號碼正確	依年月日與三項單數轉入主計系統範本

三種部署方案

	方案一 離線 exe	方案二 區網 Server	方案三 雲端 Server
部署方式	個別電腦安裝	校內架設主機	部署至雲端
資料安全	不離開本機	不出校園	存放校外，需校方同意
多人共用	不易同步	可共用設定	可共用設定
結案後維護	最容易	需有單位接手主機	需有單位接手帳號與費用

◆ 三個方案共用同一套核心模組，部署方式不影響功能

推薦方案與選擇條件

預設推薦

方案一（單機版）

- 使用者人數少
- 文件具敏感性，資料留在本機
- 結案後交接成本最低

改採其他方案的條件

多人共用，且計資中心可維護主機 → 方案二

需校外存取，且校方核准文件存放雲端 → 方案三

交接 規則與範本做成設定檔，承辦人員可自行調整

需求一實作：文件結構還原

共通規律

大字體 → 章節

次大字體 → 小標

字數最多的字級 → 內文

判斷特徵

字級統計

\+ 公文編號（一、（一）1.）

\+ 粗體

流程

讀取特徵 → 標註「章節 / 小標 / 內文」 → 轉成中介格式 → 人工確認 → 輸出 Word

檔案類型

Word / PDF 直接讀取字型；掃描檔才使用 OCR

表格

會議資訊直接轉為固定欄位

需求二實作：一份資料、多組報表規則

架構

一份原始 Excel → 六組報表規則 → 六份報表

每組規則

篩選條件 → 欄位選取 → **領域判斷** → 統計方式 → 輸出範本

領域判斷

對照表 + 關鍵字

無法判斷 → 待確認清單，由人工判定

檢核

- 納入 / 排除筆數
- 與原始資料勾稽
- 報表間交叉比對

◆ 新增報表只需新增設定，不需修改程式

需求三實作：決策表逐筆判斷

讀取 → 年度篩選 → 逐筆判斷 → 標示 / 轉入 → 輸出

順序	條件	結果
1	日期不在該年度	排除
2	無日期	逾期未上傳
3	號碼不正確	標示須交給的處室
4	號碼正確	轉入主計系統範本

以欄位名稱定位　支援民國年　保留範本格式　|　每筆資料記錄套用的規則　原始檔不修改

AI 貫穿開發流程

01 需求分析	02 系統設計	03 實作	04 測試	05 文件
逐字稿 → user story、決策表；找出規則缺漏	產出架構圖與介面初稿	規格驅動：先產生測試，再產生程式	產生邊界測試案例與合成資料	撰寫使用手冊與維護手冊

每個階段皆設人工把關點

成效量測與資料治理

AI 成效指標

01
需求缺漏發現

02
測試案例貢獻

03
程式採用率

04
開發時數

系統驗證

- golden file 比對
- 使用者驗收測試（量測導入前後的處理時間）

資料治理

- 樣本去識別化
- 處室不同意時改用合成資料

待與需求單位對焦的事項


1. 三項需求的具體文件格式與輸出範例
2. 具體呈現方式
（Web、exe、App 或其他）
3. 合併開發成集成式工具，或分開開發
4. 同一處室的會議紀錄格式是否統一

補充

- 樣本提供
- 現況處理時間
- 號碼判斷依據
- 六種報表的統計規則與領域判斷依據

時程規劃

期間	工作
10/21–10/31	需求確認
11/1–11/14	需求三開發
11/1–11/17	需求一開發（並行）
11/18–11/30	需求二開發
12/1–12/5	整合與驗收
12/9	分組專題報告

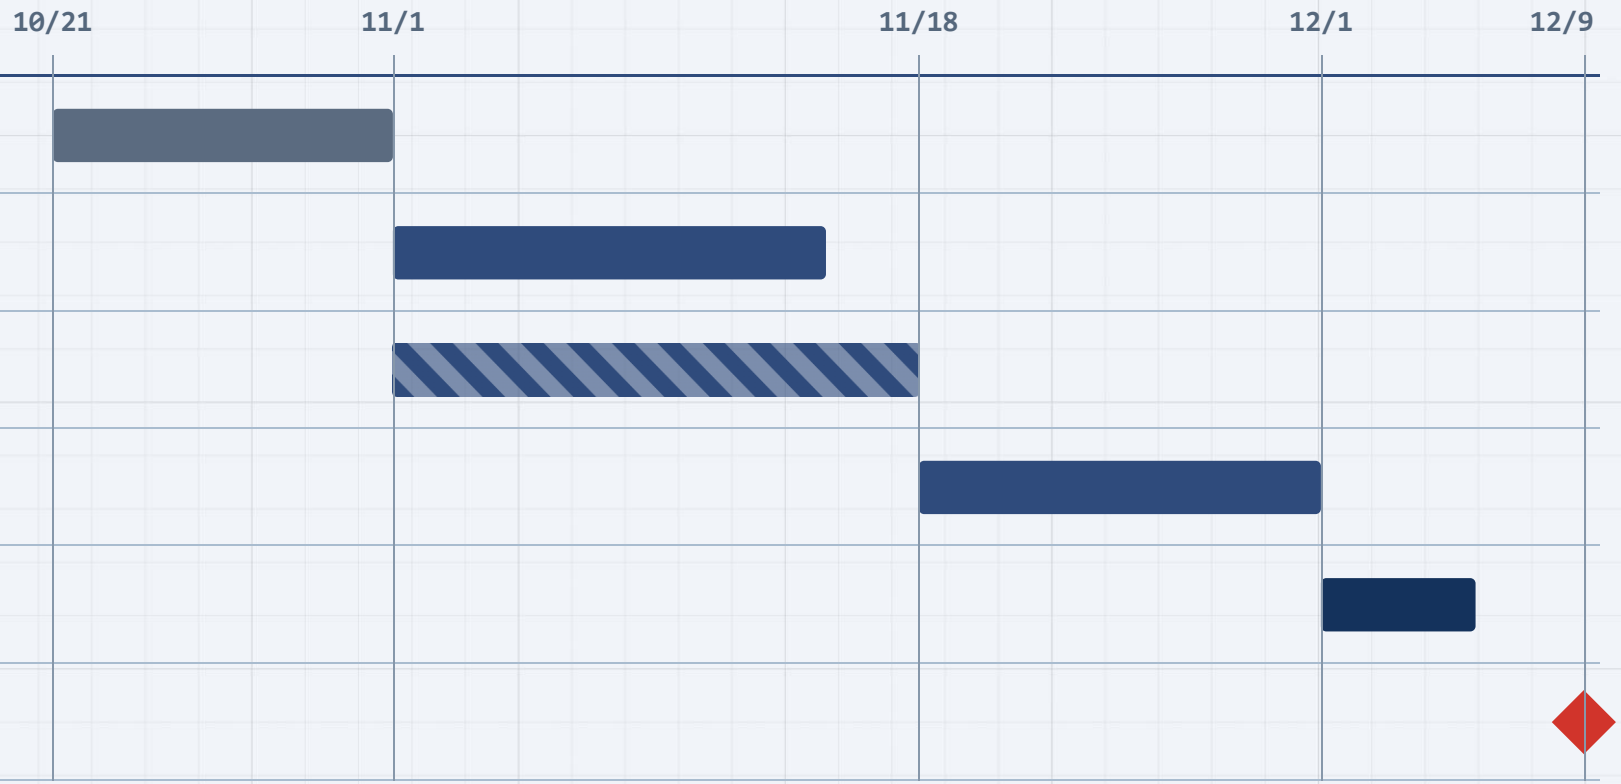

額外補充

附錄



行政文件自動化系統

分組專題提案報告

需求單位	研發處 計畫管理組
組　別	（待填）
組　員	（待填）
文件版本	v1.0
日　期	中華民國 115 年 10 月 21 日

專案計劃書

Q&A

敬 請 指 教
